

CPNV

Malorie Genoud, Alain Pichonnat, Aida Sejmenovic, Jonathan Zaehringer

INTRODUCTION

MON ENTREPRISE

Nous sommes une petite entreprise, centralisée sur des sites web de petite taille. Au vu du projet que vous souhaitez réaliser, nous pensons être dans les meilleurs dans ce domaine. Nous avons notamment réalisé le site web de LDLC, Selectronic et de Hollystar.

Nos références pour ce projet :

Malorie Genoud

Chef de projet
Technicienne en développement web
malorie.genoud@cpnv.ch

Aida Sejmenovic

Technicienne en développement web aida.sejmenovic@cpnv.ch

Alain Pichonat

Technicien en développement web alain.pichonat@cpnv.ch

Jonathan Zaehringer

Technicien en développement web jonathan.zaehringer@cpnv.ch

VOTRE PROJET

Le projet consiste à créer un site web, plutôt de petite taille et simple. Il sera consacré à afficher d'une part les films que l'utilisateur a dans un dossier sur son poste de travail et d'autre part afficher ces mêmes films avec les informations diverses de celui-ci, récupérées depuis une application déjà existante.

Pour résumer le site en lui-même, il devrait y avoir un menu de deux onglets permettant l'accès aux deux pages principales. Comme cité auparavant, la première page affichera la liste des films que l'utilisateur aura dans son dossier, qu'il aura choisi auparavant dans les options. La deuxième page listera ces mêmes films, mais avec toutes les informations de ceux-ci dites « importantes », comme : le nom du film, son synopsis/description, sa durée, la date de sortie etc.

Les objectifs principaux sont que le client doit pouvoir interagir avec le site facilement, sans devoir aller chercher dans des endroits complexes et il doit pouvoir facilement accéder aux informations de ses films.

CONTACTS

Le prestataire	Le client
Centre professionnel du Nord	Centre professionnel du Nord
Avenue de la Gare 14	Avenue de la Gare 14
Sainte-Croix	Sainte-Croix
024 557 60 70	024 557 60 70
Horaires :	Horaires :
Lundi :	Lundi :
08h00-12h00	08h00-12h00
13h00-16h30	13h00-16h30
Mardi à Vendredi :	Mardi à Vendredi :
08h00-12h00	08h00-12h00
13h00-17h00	13h00-17h00
Personnes de contact :	Personnes de contact :
Malorie Genoud	Hurni Pascal
Chef de projet	hurni.pascal@cpnv.ch
Technicienne en développement web	nam.pascar@epnv.cm
genoud.malorie@cpnv.ch	Saison Yann
Bernard Spiritor	saison.yann@cpnv.ch
Alain Pichonat	Sancting and Company
Technicien en développement web	
pichonnat.alain@cpnv.ch	
·	
Aida Sejmenovic	
Technicienne en développement web	
sejmenovic.aida @cpnv.ch	
Jonathan Zaehringer	
Technicien en développement web	
zaehringer.jonathan@cpnv.ch	

NOTRE PROPOSITION

Pour réaliser le site web, nous avons décidé d'utiliser une interface de site « simple », car l'utilisateur aura juste à vérifier si son dossier est effectivement bien le bon, s'il ne l'est pas il devra le choisir dans « options ».

Nous allons principalement utiliser une base de données qui regroupera les films du client pour la première page et un bouton « options » pour choisir le dossier s'il ne l'a pas fait ou s'il souhaite le changer. Ensuite pour la deuxième page, une API (logiciel programmé externe qui permet de compléter une autre interface de programmation) afin de chercher les informations de ses films.

LES ETAPES ET SOUS-ETAPES :

- 1. Vérifier que la page « Your list » s'affiche correctement
- 2. Vérifier que la navigation entre la page « Your list » et « Web list » fonctionne
- 3. Vérifier que la page « Web list » s'affiche correctement
- 4. Vérifier que le bouton « Settings » fonctionne et affiche correctement les options disponibles
- 5. Vérifier que l'option « Browse » fonctionne et ouvre une nouvelle fenêtre de recherche d'un dossier quelconque
- 6. Vérifier que le bouton « Load the link » de l'option « Browse » permet de charger les fichiers contenus dans le dossier et de l'ajouter dans la base de données.
- 7. Vérifier que l'option « Refresh » fonctionne en rafraîchissant la page « Your list »
- 8. Vérifier que le bouton « Display the movies » de la page « Your list » et « Web list » fonctionne et affiche la liste des films soit par rapport au dossier pour la page « Your list », soit les informations principales de la page « Web list »
- 9. Vérifier que la navigation entre les pages pour l'affichage de la liste des films fonctionne (1, 2, 3, etc...)
- 10. Vérifier que le bouton « Next » fonctionne
- 11. Vérifier que le bouton « Previous » fonctionne
- 12. Vérifier que le bouton « Search » de la page « Your list » permet la de récupérer les informations concernant le nom du film entrer dans le champ « Name of film »
- 13. Vérifier que le bouton « Search » de la page « Web list » permet la de récupérer les informations concernant le nom du film entrer dans le champ « Name of film »
- 14. Vérifier que le bouton « Filter » fonctionne et offre la possibilité de faire un filtre sur plusieurs points comme l'année, le nom d'un acteur et ainsi de suite
- 15. Vérifier que lorsqu'on clique sur « Mors informations », ceci permet d'afficher le détail du film en question.

MAQUETTES PRÉLIMINAIRES

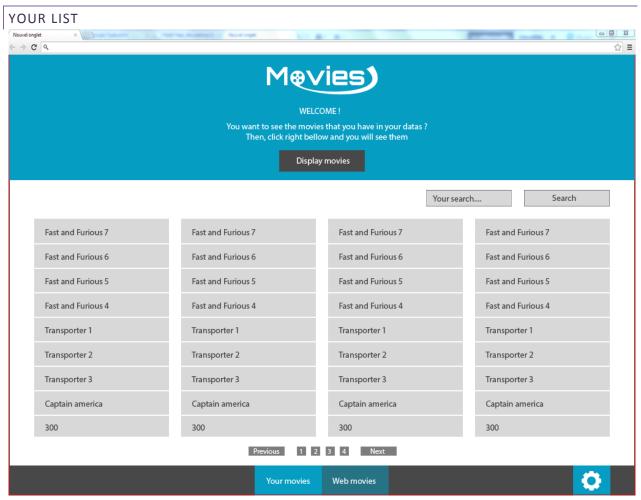


Figure 1 : Page d'accueil


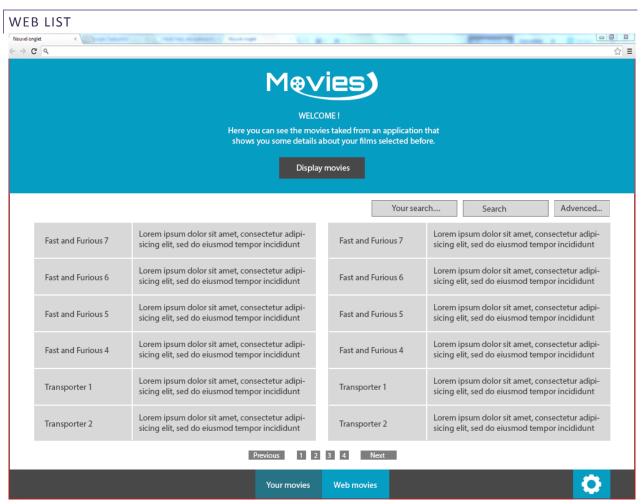



Figure 2 : Page films depuis l'API

SCHÉMA DE NAVIGATION



DROITS UTILISATEURS

L'utilisateur pourra faire ces choses suivantes :

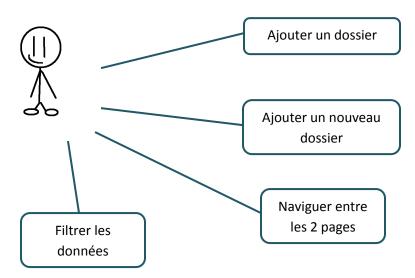

ETAPES DE RÉALISATION

PLANIFICATION INITIALE

Début du projet	0 jour	Mar 25.08.15	Mar 25.08.15	
Documentation	3060 min	Jeu 27.08.15	Jeu 17.12.15	Aida Sejmenovic[10%];Alain Pichonnat[10%];Jonathan Zaehringer[30%];Malorie Genoud[50%]
- Analyse préliminaire	0.21 jour	Mar 25.08.15	Mar 25.08.15	
Introduction	10 min	Mar 25.08.15	Mar 25.08.15	Malorie Genoud
Organisation	45 min	Mar 25.08.15	Mar 25.08.15	Malorie Genoud
Objectifs	30 min	Mar 25.08.15	Mar 25.08.15	Malorie Genoud
Planification initiale	5 min	Mar 25.08.15	Mar 25.08.15	Malorie Genoud[50%];Aida Sejmenovic[50%]
- Analyse	1.77 jours	Jeu 27.08.15	Jeu 17.09.15	
Cahier des charges détaillé	135 min	Jeu 27.08.15	Jeu 27.08.15	Malorie Genoud
Stratégie de test	45 min	Mar 01.09.15	Mar 01.09.15	Malorie Genoud
Budget initial	5 min	Mar 01.09.15	Mar 01.09.15	Malorie Genoud[50%];Aida Sejmenovic[50%]
Etude de faisabilité	40 min	Mar 01.09.15	Mar 01.09.15	Malorie Genoud
Analyse du choix de langage	20 min	Jeu 03.09.15	Jeu 03.09.15	Jonathan Zaehringer
Analyse de l'API	20 min	Jeu 03.09.15	Jeu 03.09.15	Alain Pichonnat
Analyse de la Regex	30 min	Jeu 03.09.15	Jeu 03.09.15	Jonathan Zaehringer
Planification finale	450 min	Jeu 03.09.15	Jeu 17.09.15	Aida Sejmenovic[50%];Malorie Genoud[50%]
- Conception	1.3 jours	Jeu 17.09.15	Mar 27.10.15	
Analyse de l'environnement	5 min	Jeu 17.09.15	Jeu 17.09.15	Malorie Genoud
Détermination de l'arborescence du site et des rubriques	45 min	Jeu 17.09.15	Jeu 17.09.15	Aida Sejmenovic[25%];Alain Pichonnat[25%];Jonathan Zaehringer[25%];Malorie Genoud[25%]
Définition de la charte graphique	90 min	Jeu 17.09.15	Mar 29.09.15	Malorie Genoud[50%];Aida Sejmenovic[50%]
Maquette graphique	180 min	Mar 29.09.15	Mar 06.10.15	Aida Sejmenovic[90%];Malorie Genoud[10%]
Conception de la base de données	90 min	Mar 06.10.15	Jeu 08.10.15	Aida Sejmenovic[45%];Malorie Genoud[10%];Jonathan Zaehringer[45%]
Conception du code	90 min	Jeu 08.10.15	Jeu 08.10.15	Jonathan Zaehringer[50%];Alain Pichonnat[50%]
Modules externes	20 min	Jeu 08.10.15	Mar 27.10.15	Aida Sejmenovic[25%];Alain Pichonnat[25%];Jonathan Zaehringer[25%];Malorie Genoud[25%]
Choix de la formule d'hébergement	25 min	Mar 27.10.15	Mar 27.10.15	Alain Pichonnat[50%];Jonathan Zaehringer[50%]

- Réalisation	2.19 jours	Mar 27.10.15	Mar 24.11.15	
Dossier de réalisation	45 min	Mar 27.10.15	Mar 27.10.15	Malorie Genoud
[–] Code du site	1.79 jours	Mar 27.10.15	Jeu 19.11.15	
Style graphique des pages 1 et 2	90 min	Mar 27.10.15	Jeu 29.10.15	Malorie Genoud[50%];Aida Sejmenovic[50%]
Naviguer entre les pages 1 et 2	45 min	Jeu 29.10.15	Jeu 29.10.15	Aida Sejmenovic[50%];Malorie Genoud[50%]
Recherche de dossier (page1)	90 min	Jeu 29.10.15	Mar 03.11.15	Jonathan Zaehringer[50%];Alain Pichonnat[50%]
Bouton d'affichage de la liste (page 1)	30 min	Mar 03.11.15	Jeu 05.11.15	Aida Sejmenovic[50%];Malorie Genoud[50%]
Recherche des données sur l'API (page 2)	180 min	Jeu 05.11.15	Mar 10.11.15	Alain Pichonnat
Affichage de la liste des films (page 2)	90 min	Mar 10.11.15	Jeu 12.11.15	Jonathan Zaehringer[50%];Alain Pichonnat[50%]
Filtre (page 2)	90 min	Jeu 12.11.15	Mar 17.11.15	Aida Sejmenovic[50%];Malorie Genoud[50%]
Pop-up données détaillées liste des films (page 2)	90 min	Mar 17.11.15	Jeu 19.11.15	Jonathan Zaehringer[50%];Alain Pichonnat[50%]
Navigation entre les listes (page 1 et 2)	45 min	Jeu 19.11.15	Jeu 19.11.15	Aida Sejmenovic[50%];Malorie Genoud[50%]
Description des tests effectués	90 min	Jeu 19.11.15	Mar 24.11.15	Aida Sejmenovic[25%];Alain Pichonnat[25%];Jonathan Zaehringer[25%];Malorie Genoud[25%]
Erreurs restantes	30 min	Mar 24.11.15	Mar 24.11.15	Aida Sejmenovic[25%];Alain Pichonnat[25%];Jonathan Zaehringer[25%];Malorie Genoud[25%]
Dossier d'archivage	5 min	Mar 24.11.15	Mar 24.11.15	Aida Sejmenovic[25%];Alain Pichonnat[25%];Jonathan Zaehringer[25%];Malorie Genoud[25%]
Conclusion	90 min	Mar 24.11.15	Jeu 26.11.15	Aida Sejmenovic[25%];Jonathan Zaehringer[25%];Malorie Genoud[25%];Alain Pichonnat[25%]
Mise à jour de la planification finale	90 min	Jeu 26.11.15	Mar 01.12.15	Aida Sejmenovic[50%];Malorie Genoud[50%]
Annexes	45 min	Mar 01.12.15	Mar 01.12.15	Aida Sejmenovic[25%];Alain Pichonnat[25%];Jonathan Zaehringer[25%];Malorie Genoud[25%]
Find du projet	0 jour	Jeu 17.12.15	Jeu 17.12.15	

ACCORD DES PARTIES

CLIENTS	Hurni Pasal	Yann Saison
Lieu		
Date		
Signature		

TECHNICIENS	Genoud Malorie	Pichonnat Alain	Sejmenovic Aida	Zaehringer Jonathan
Lieu				
Date				
Signature				
